

芽室町営水泳プール等整備事業について

1 アスベスト含有建材の除去について

(1)アスベストの含有が判明した箇所

	名 称	除去箇所	備 考
1	テニスコート	コート床面の塗装	資料2-1参照
2	勤労青少年ホーム	室内の内装材	資料2-2参照

(2)除去方法

	名 称	除去方法	備 考
1	テニスコート	3.6m四方(高さ 2.4m)の移動可能な仮囲いを設置し、床面塗料を削り取る。	
2	勤労青少年ホーム	内装材を取り外す。	

2 供用開始時期及び既存プールの供用終期について

(1)供用開始時期について

世界情勢の影響により、空調設備の納入が令和5年1月中旬以降になるため、新プールに係る必要物品等の搬入や供用開始に向けた準備が、令和4年度中に終わることが困難となる。併せて外構工事においては、利用者駐車場の整備が困難となることから、サービスの低下に繋がる懸念されるため、供用開始を令和5年7月1日にしようとするものである。

(2)既存プールの供用終期について

新プール供用開始に向け、既存プールから新プールに電気・設備の切り替え作業を実施する。作業は、プール運営を継続しながら実施することが不可能なため、既存プールの供用を令和5年3月31日で終了し、令和5年4月以降に電気・設備の切り替え作業を実施する。また、作業後は、給水、給電に係る試験調整を実施することから、新プール供用開始までの一定期間は、プールを使用することが不可能である。

工事スケジュール(令和5年7月1日～供用開始を想定)


	日 程	項 目
1	令和5年2月中旬以降	つなぐ棟工事完了
2	令和5年3月31日	既存プール供用終了
3	令和5年5月	新プール建設・改修工事完了
4	令和5年4月～6月	(1)電気・設備切り替え作業 (2)給水、給電に係る試験調整 (3)外構工事(駐車場整備等) (4)施設内に必要物品等の搬入 (5)供用開始に向けた準備
5	令和5年7月1日～	新プール供用開始

※工事・工程計画は、資料2-3参照

3 今後のスケジュール

	日 程	項 目	備 考
1	令和4年7月12日	第5回厚生文教常任委員会	アスベスト除去、供用開始等の説明
2		直近の本会議	アスベスト除去工事関連費用補正 提案予定
3	令和4年9月	9月定例会議	工事関連契約変更提案予定
4	令和4年12月	12月定例会議	条例改正提案予定 (随時、所管委員会に情報提供)
5	令和5年3月31日	既存プール供用終了	
6	令和5年7月1日	新プール供用開始	

東一条本通

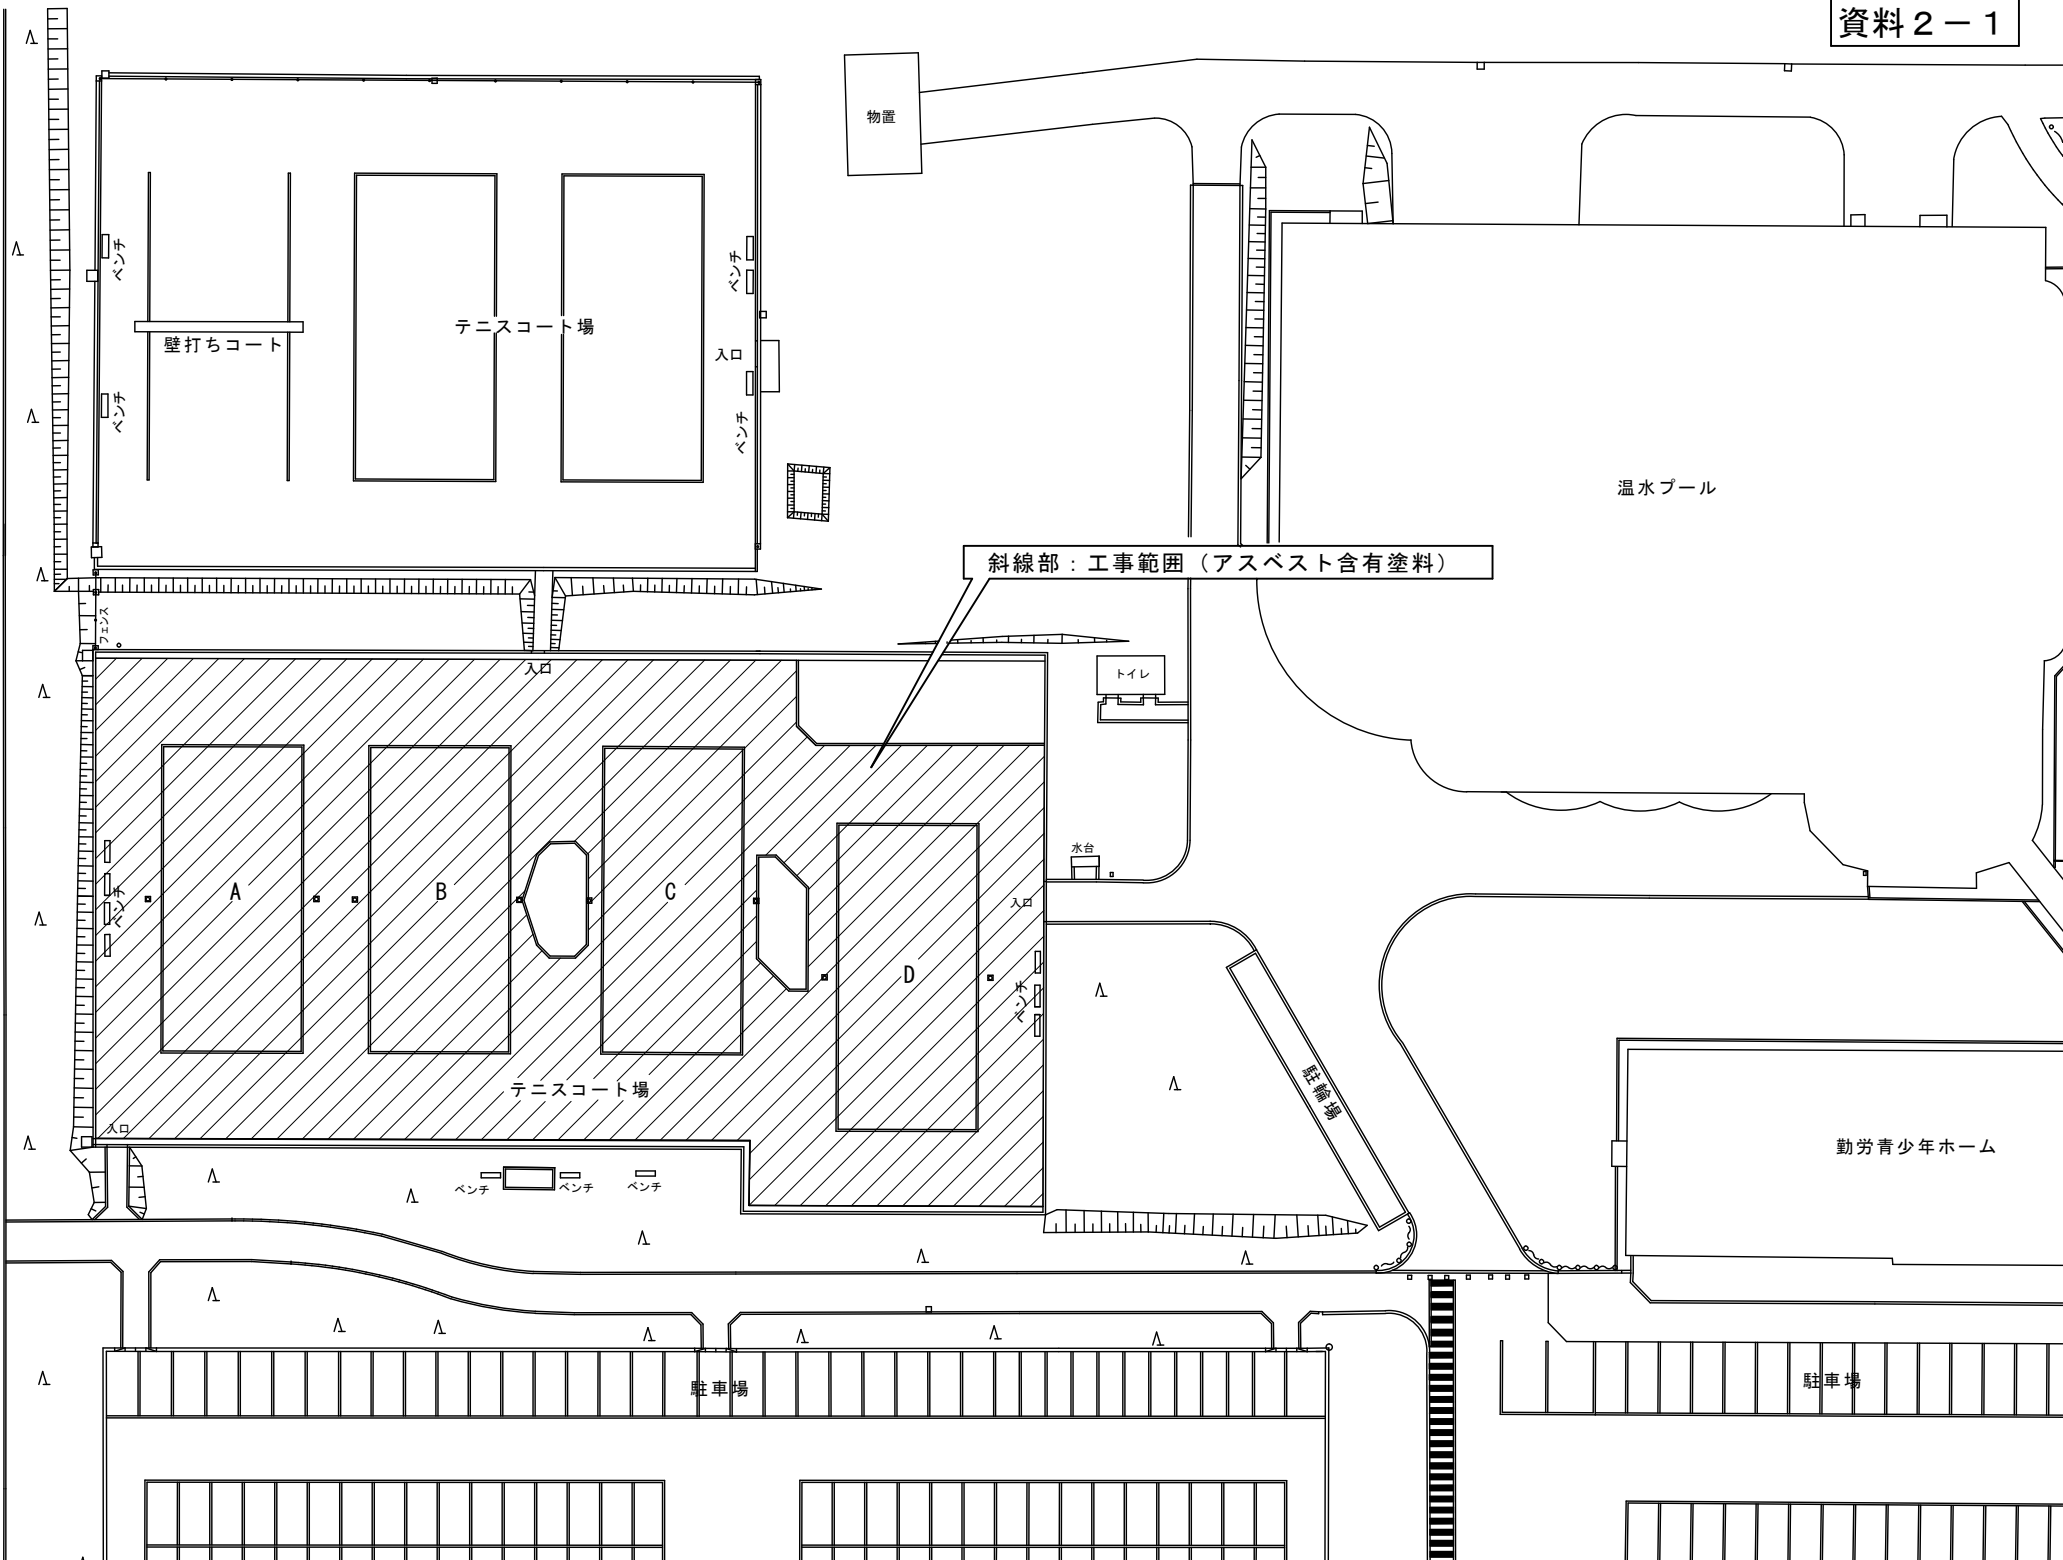

物置

壁打ちコート

テニスコート場

温水プール

斜線部：工事範囲（アスベスト含有塗料）

トイレ

水台


テニスコート場

駐輪場


勤労青少年ホーム

駐車場

駐車場

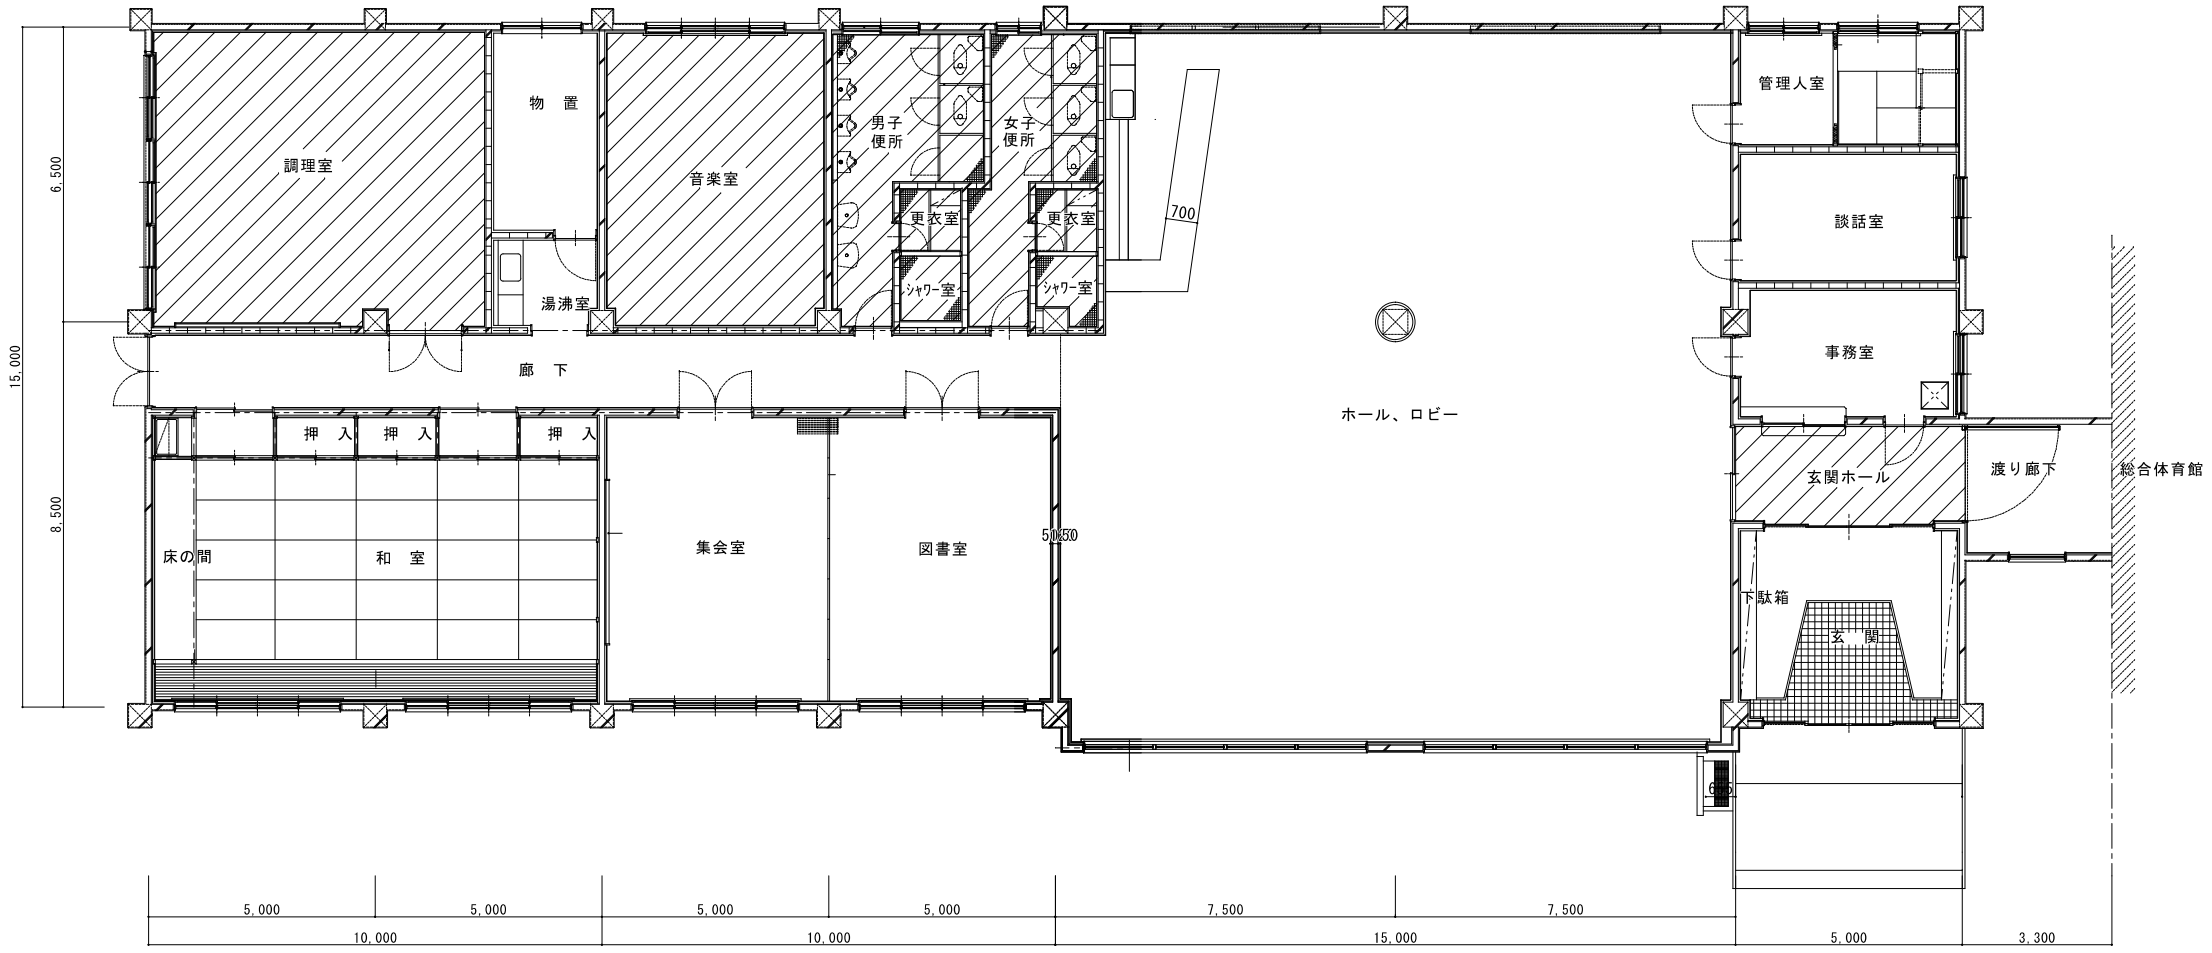

凡例

-  工事範囲 (アスベスト含有内装材)
※天井ボード、床ビニルシート

工事・行程計画表

資料2-3

