


役場庁舎整備工事について

1. 旧庁舎解体に向けたアスベスト等調査結果について

- ①根拠～石綿に係る関係法令（大気汚染防止法、労働安全衛生法・石綿障害予防規則、建設リサイクル法）により、解体等工事を行う場合、受注者（元請業者）は、事前に石綿の有無を調査することが義務付けられている。
- ②経過～請負契約時の要求水準書において、アスベスト等の処分に係る費用は、本町の負担としている。（当初の解体工事の設計では処分に係る費用を含んでいない。）
- ③調査内容～設計図書及び現地調査により、飛散性のある石綿含有吹付け材は無いことを確認した。
飛散性のある断熱材と保温材、非飛散性の石綿使用建材（成形板）及び仕様塗材、接着剤について、使用メーカーを特定できない部材のサンプリングを行い、石綿の含有について分析調査を実施した。
また、ダイオキシン類についても煙突及び焼却炉からのサンプリングを行い、分析調査を実施した。
⇒ サンプリング調査箇所図を参照 P2～6
- ④調査結果～別紙の報告書（写し）のとおり、アスベスト及びダイオキシン類が検出された。
⇒ 報告書（写し）を参照 P7～9

2. 庁舎整備スケジュール


- ①当初～令和3年3月～4月（2ヶ月）で旧庁舎を解体し、その後地下階部分の改修を9月いっぱいまで完了する工期設定で進めていた。
- ②変更～令和3年度早期に予算の補正及び請負契約金額の変更を進め、現在の工期を1～2ヶ月延長する変更を予定。

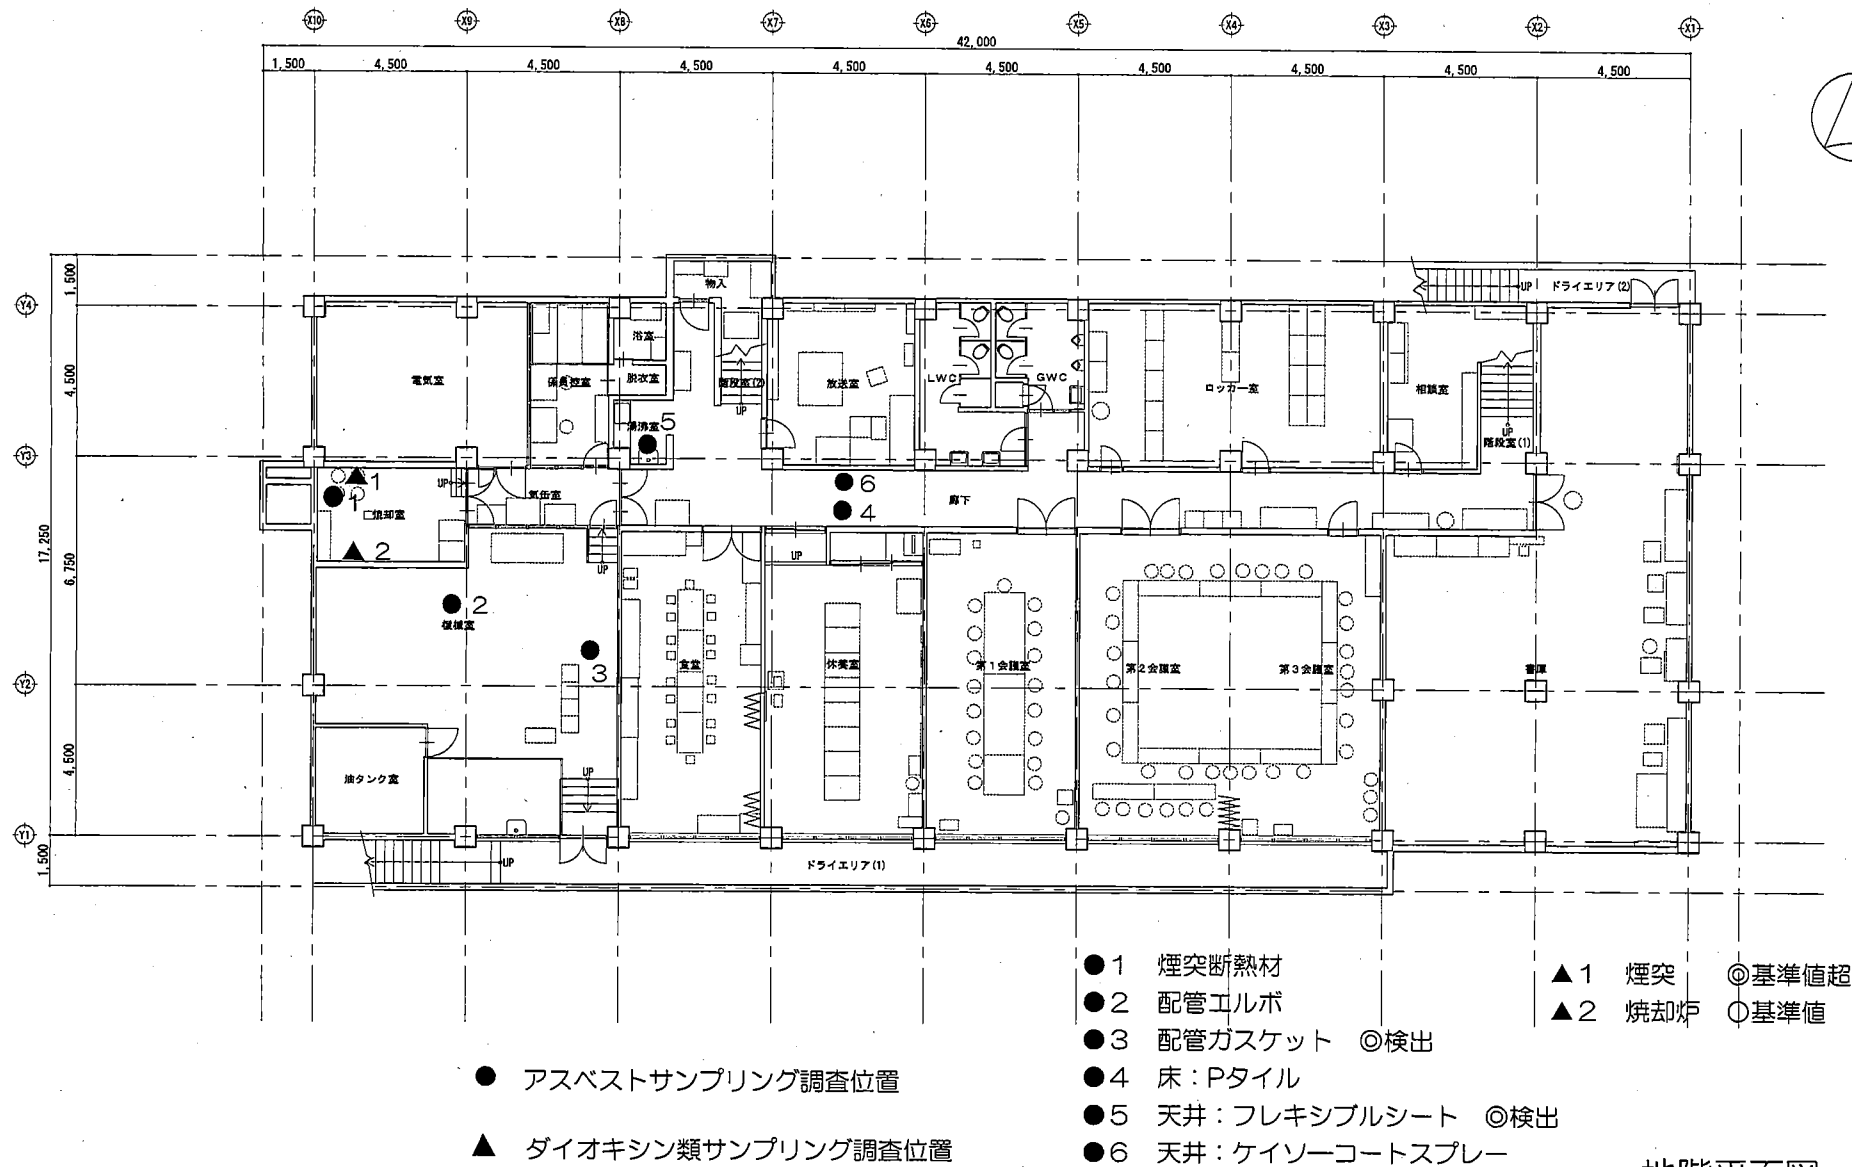

地階平面図

8F平面図

P 5

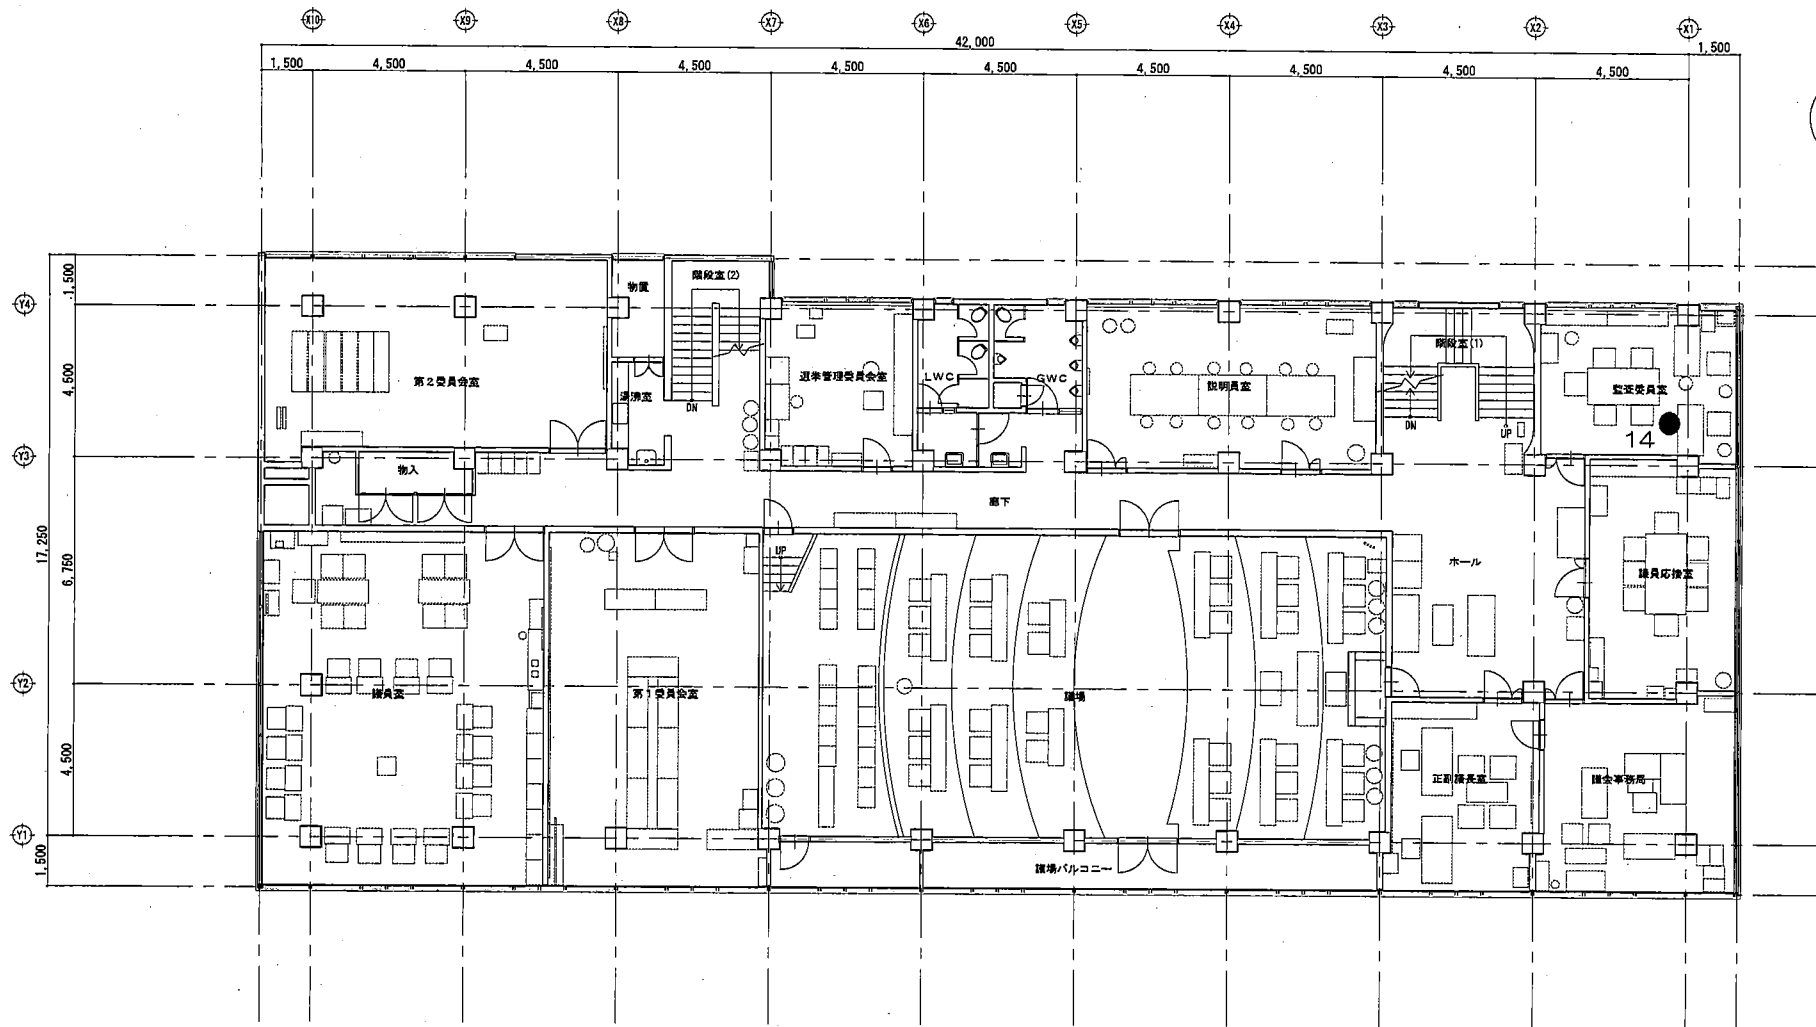

● アスベストサンプリング調査位置

●14 天井：吸音テックス

3階平面図

3F平面図

アトリエバンク・創造設計舎 設計共同企業体
代表者：株式会社アトリエバンク 一級建築士事務所登録 (昭) 第426号

作成と改訂設計者	一級建築士 210020 号	図面 部	設計	NO.	居室町役場庁舎解体工事	※	D-09
その他設計者	一級建築士 350787 号	設計 部	設計	NO.	第一庁舎 3階平面図	管理図面士	
その他設計者	一級建築士 210009 号	大工 部	設計	NO.	A1:1/ 75 A2:1/150	一級建築士 210020 号	平面 図面



2021 年 2 月 2 日

様

計量証明事業登録 濃度 北海道 第 621 号
作業環境測定機関登録 第 001-23 号

株式会社 スフエチャ

帯広市西 18 条 17

TEL (0155) 33-4400

FAX (0155) 33-7100

この度、御依頼を賜りました「建材中のアスベスト分析」につきまして、分析が完了しましたので、速報を御報告致します。

調査は、「JIS A 1481 建材製品中のアスベスト含有率測定方法(2016年)」および、「アスベスト分析マニュアル(1.20版) 厚生労働省」に従って実施しました。

以下に建材中のアスベスト含有の有無の分析(アスベストの定性分析)の結果を示します。

【分析結果速報】

物件名：芽室町旧役場解体工事(事前調査)


受付日：2021 年 1 月 20 日

分析結果表(1/2)

調査箇所	建材名		分析結果		
			石綿の種類	推定石綿 質量分率	石綿含有判定結果
外部 外壁	リシン	上塗材	—	無検出	含有なし
		主材	—	無検出	含有なし
		下地調整塗材	—	無検出	含有なし
外部 外壁	マスチック	上塗材	—	無検出	含有なし
		主材	—	無検出	含有なし
		下地調整塗材	—	無検出	含有なし
外部 外壁	タイル	上塗材	—	無検出	含有なし
		主材	—	無検出	含有なし
		下地調整塗材	クリソタイル	5-50%	アスベスト含有

分析結果表(2/2)

調査箇所	建材名		分析結果		
			石綿の種類	推定石綿 質量分率	石綿含有判定結果
外部 軒天・ 地下 湯沸室 天井	フレキシブルシート		クリソタイル	5-50%	アスベスト含有
煙突 堆積物	煙突堆積物		—	無検出	含有なし
地下 機械室 配管エルボ部	保温材		—	無検出	含有なし
地下 機械室 配管結合部	ガasket パッキン		クリソタイル	5-50%	アスベスト含有
地下 廊下 床	P タイル (接着剤共)	本体	—	無検出	含有なし
		接着剤	—	無検出	含有なし
地下 廊下 天井	石膏ボード (ケイソート スプレー共)	ケイソートスプレー	—	無検出	含有なし
		上紙	—	無検出	含有なし
		石こう	—	無検出	含有なし
		下紙	—	無検出	含有なし
2F 助役室 床 (副室主)	ロンリウム (接着剤共)	本体	—	無検出	含有なし
		接着剤	クリソタイル	0.1-5%	アスベスト含有
2F 印刷室 天井	タイガー トーン	上紙	—	無検出	含有なし
		石こう	—	無検出	含有なし
		下紙	—	無検出	含有なし
2F 応接室 天井	ミネラートン		クリソタイル	0.1-5%	アスベスト含有
3F 監査員選管室 天井	吸音テックス		—	無検出	含有なし
外部 屋上 屋根	アスファルト防水シート		—	無検出	含有なし



2021 年 2 月 15 日

様

計量証明事業登録 濃度 北海道 第 081 号

作業環境測定機関登録 第 01423 号

株式会社 スコーシャ

帯広市西 18 条北 1 丁目

TEL (0155) 33-4400

FAX (0155) 33-7100

この度、御依頼を賜りました「芽室町旧役場解体工事(事前調査) ダイオキシン類等分析」につきまして、ダイオキシン類の分析が完了しましたので、速報を御報告致します。

【分析結果速報】

物件名：芽室町役場

受付日：2021 年 1 月 20 日

分析結果表

ダイオキシン類の分析結果(解体方法・保護具選定に関する調査結果)

試料名	分析結果 (毒性当量) (pg-TEQ/g)	基準値 ¹⁾ (pg-TEQ/g)
焼却炉 付着物	150	3,000
煙突 付着物	5,300	3,000

¹⁾「基準値」は、「ばいじん等の処理に係る基準値(ダイオキシン類対策特別措置法施行規則第7条の2)」の基準値である。

ダイオキシン類の分析結果(廃棄物処理法に関する調査結果)

試料名	分析結果 (毒性当量) (ng-TEQ/g)	基準値 ¹⁾ (ng-TEQ/g)
焼却炉 付着物	0.15	3
煙突 付着物	5.3	3

¹⁾「基準値」は、「特別管理産業廃棄物の判定基準(廃棄物処理法施行規則第1条の2)」の基準値である。
