

議案第15号

渋山支線排水路災害復旧工事（H28繰越）請負変更契約締結の件

渋山支線排水路災害復旧工事（H28繰越）請負変更契約を次のとおり締結しようとするものであります。


平成30年6月22日提出

芽室町長 宮 西 義 憲

- 1 工 事 名 渋山支線排水路災害復旧工事（H28繰越）
- 2 工 事 場 所 芽室町 渋山
- 3 契 約 金 額 変更前 66,906,000円
変更後 87,048,000円
- 4 契約の相手方 芽室町東6条10丁目1番1
株式会社北土開発
代表取締役 山田 朝常
- 5 工 期 自 平成29年 6月19日
至 平成30年 7月20日
- 6 工 事 概 要 渋山支線排水路災害復旧（渋山5）
連結ブロック布設替、土砂埋そく除去、特殊かご、法面復旧、
産業廃棄物処理、仮設工
- 7 工事変更内容 現地精査に伴う数量変更（参考資料2参照）

説 明

渋山支線排水路災害復旧工事（H28繰越）請負変更契約を締結することについて、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定に基づき、議会の議決を得ようとするものであります。

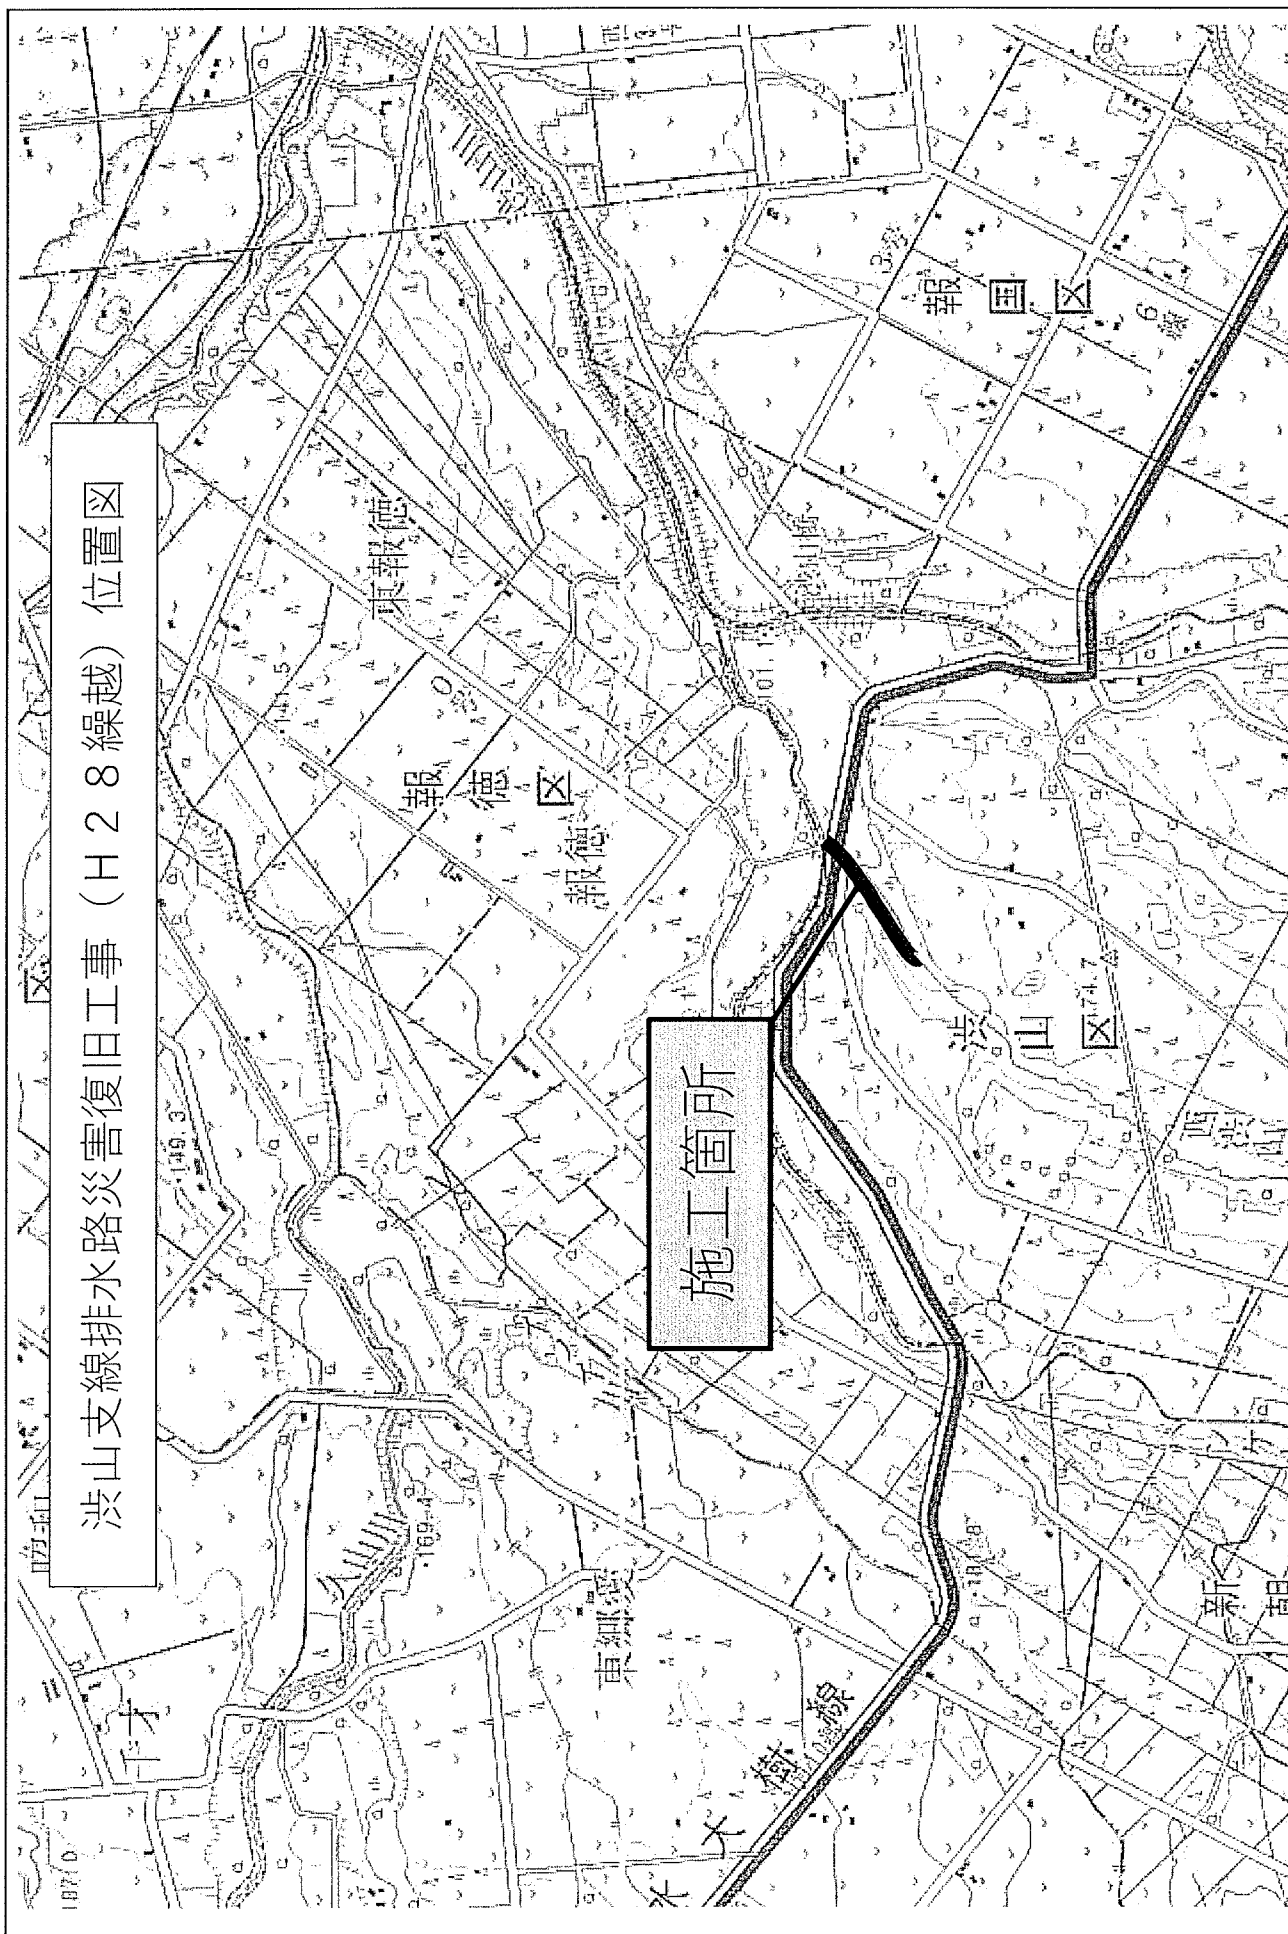

設計変更理由書(渋山支線排水路)

1. 変更理由

現地精査に伴い数量変更が生じたことにより、設計金額を変更する。

2. 1の理由に伴い下記のとおり変更が生じた

・渋山5地区

【現地精査による数量変更】

- (1) 土工－購入盛土材、運搬の増: 2,392m³→4,352m³
- (2) 法面工－法面整形増に伴う張芝の増: 742m²→1,492m²
- (3) 護岸工－連節ブロック布設替,新設の増: 1,199m²→1,372m²、1,298m²→1,536m²
- (4) 仮設工－工事用水中ポンプ運転の増: 73日→137日
- (5) 除雪工－冬季施工のため: 工事用道路0km→0.9km

当初契約額		66,906,000円
変更後契約額		87,048,000円
差 額	(増額)	20,142,000円
