

議案第17号

上美生排水路災害復旧工事（H28繰越）請負変更契約締結の件

上美生排水路災害復旧工事（H28繰越）請負変更契約を次のとおり締結しようとするものであります。

平成30年6月22日提出


芽室町長 宮 西 義 憲

- | | | | | |
|---|---------|---|---------------|--|
| 1 | 工 事 名 | 上美生排水路災害復旧工事（H28繰越） | | |
| 2 | 工 事 場 所 | 芽室町 上美生 | | |
| 3 | 契 約 金 額 | 変更前 | 53,460,000円 | |
| | | 変更後 | 59,367,600円 | |
| 4 | 契約の相手方 | 芽室町東1条5丁目9番地 株式会社宮間工業 代表取締役 宮間 啓好 | | |
| 5 | 工 期 | 変更前 | 自 平成29年 6月19日 | |
| | | | 至 平成30年 7月 2日 | |
| | | 変更後 | 自 平成29年 6月19日 | |
| | | | 至 平成30年 7月20日 | |
| 6 | 工 事 概 要 | 上美生第1号及び第2号明渠排水路災害復旧（上美生8～12） 連結ブロック布設替、特殊かご、法面復旧、裏込材復旧、現場 打ちフルーム水路、ふとんかご、産業廃棄物処理、仮設工 | | |
| 7 | 工事変更内容 | 現地精査に伴う数量変更（参考資料2参照） | | |

説 明

上美生排水路災害復旧工事（H28繰越）請負変更契約を締結することについて、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定に基づき、議会の議決を得ようとするものであります。

上美生排水路災害復旧工事（H28繰越）位置図

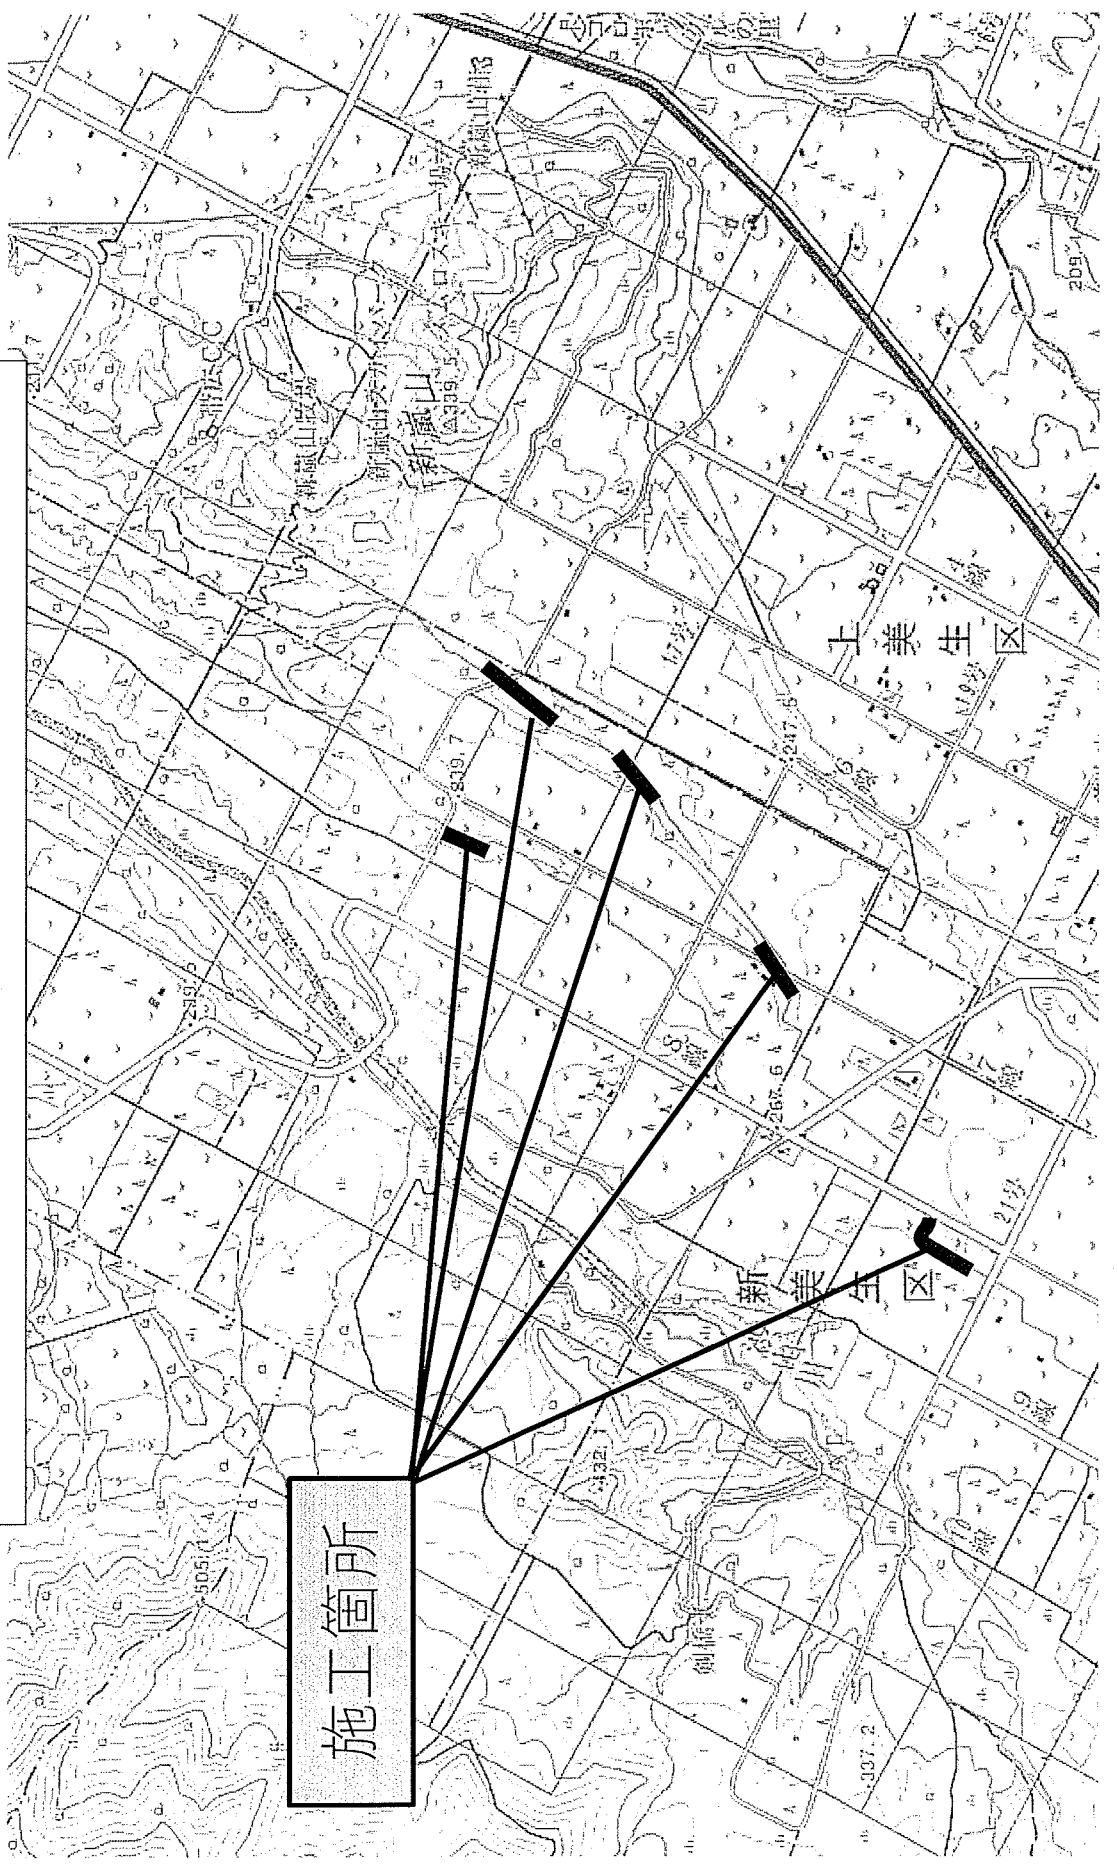

設計変更理由書(上美生排水路)

1. 変更理由

現地精査による数量変更が生じたことにより、設計金額及び工期を変更する。

2. 1の理由に伴い下記のとおり変更が生じた

・上美生8地区

【現地精査による数量変更】

| |
|-----------------|
| 4,508,700円 (増額) |
|-----------------|

(1) 土工—購入盛土材、運搬の増: 123m³→543m³

(2) 法面工—張芝の増: 590m²→837m²

(3) 護岸工—連節ブロック布設替、新設の増減: 86m²→211m²、42m²→17m²

(4) 仮設工—敷鉄板供用日、工事用水中ポンプ運転の増減: 33日→48日、25日→20日

(5) 除雪工—冬季施工のため: 工事用道路0km→0.5km

・上美生9地区

【現地精査による数量変更】

| |
|-----------------|
| 1,498,760円 (増額) |
|-----------------|

(1) 土工—購入盛土材、運搬の増: 506m³→843m³

(2) 法面工—張芝の増: 801m²→1,107m²

(3) 護岸工—新設の増: 238m²→291m²

(4) 仮設工—敷鉄板供用日、工事用水中ポンプ運転の増減: 169日→144日、53日→56日

(5) 除雪工—冬季施工のため: 工事用道路0km→0.7km

・上美生10地区

【現地精査による数量変更】

| |
|--------------|
| 37,030円 (増額) |
|--------------|

(1) 土工—購入盛土材、運搬の減: 2m³→1m³

(2) 護岸工—新設の増: 37m²→41m²

(3) 仮設工—敷鉄板供用日、工事用水中ポンプ運転の増減: 6日→8日、15日→5日

(4) 除雪工—冬季施工のため: 工事用道路0km→0.1km

・上美生11地区

【現地精査による数量変更】

△143,080円 (減額)

(1) 土工－流用土の増: 13m³→20m³

(2) 護岸工－連節ブロック布設替,新設の増減: 125m²→133m²、26m²→19m²

(3) 仮設工－敷鉄板供用日、工事用水中ポンプ運転の増減: 12日→13日、18日→7日

(4) 除雪工－冬季施工のため: 工事用道路0km→0.3km

・上美生12地区

【現地精査による数量変更】

6,190円 (増額)

(1) 土工－張芝面積規格の変更による減: 300m²未満→500m²以上

(2) 水路工－型枠、鉄筋量の増: 8m²→18m²、0.12t→0.19t

(3) 仮設工－敷鉄板供用日、工事用水中ポンプ運転の増減: 9日→13日、18日→7日

(4) 除雪工－冬季施工のため: 工事用道路0km→0.1km

合 計

5,907,600円

(増額)

| | |
|--------|-----------------|
| 当初契約額 | 53,460,000円 |
| 変更後契約額 | 59,367,600円 |
| 差 額 | (増額) 5,907,600円 |
