

議案第18号

新朝日排水路災害復旧工事（H28繰越）請負変更契約締結の件

新朝日排水路災害復旧工事（H28繰越）請負変更契約を次のとおり締結しようとするものであります。


平成30年6月22日提出

芽室町長 宮 西 義 憲

- 1 工 事 名 新朝日排水路災害復旧工事（H28繰越）
- 2 工 事 場 所 芽室町 新朝日
- 3 契 約 金 額 変更前 42,984,000円
変更後 56,894,400円
- 4 契約の相手方 芽室町東11条10丁目1番地
青木建設株式会社
代表取締役社長 青木 昇
- 5 工 期 変更前 自 平成29年 6月 2日
至 平成30年 7月 2日
変更後 自 平成29年 6月 2日
至 平成30年 7月20日
- 6 工 事 概 要 新朝日幹線排水路災害復旧（新朝日5）
連結ブロック布設替、特殊かご、法面復旧、床止工、落口工
再敷設、土砂埋そく除去、産業廃棄物処理、仮設工
- 7 工事変更内容 現地精査に伴う数量変更（参考資料2参照）

説 明

新朝日排水路災害復旧工事（H28繰越）請負変更契約を締結することについて、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定に基づき、議会の議決を得ようとするものであります。

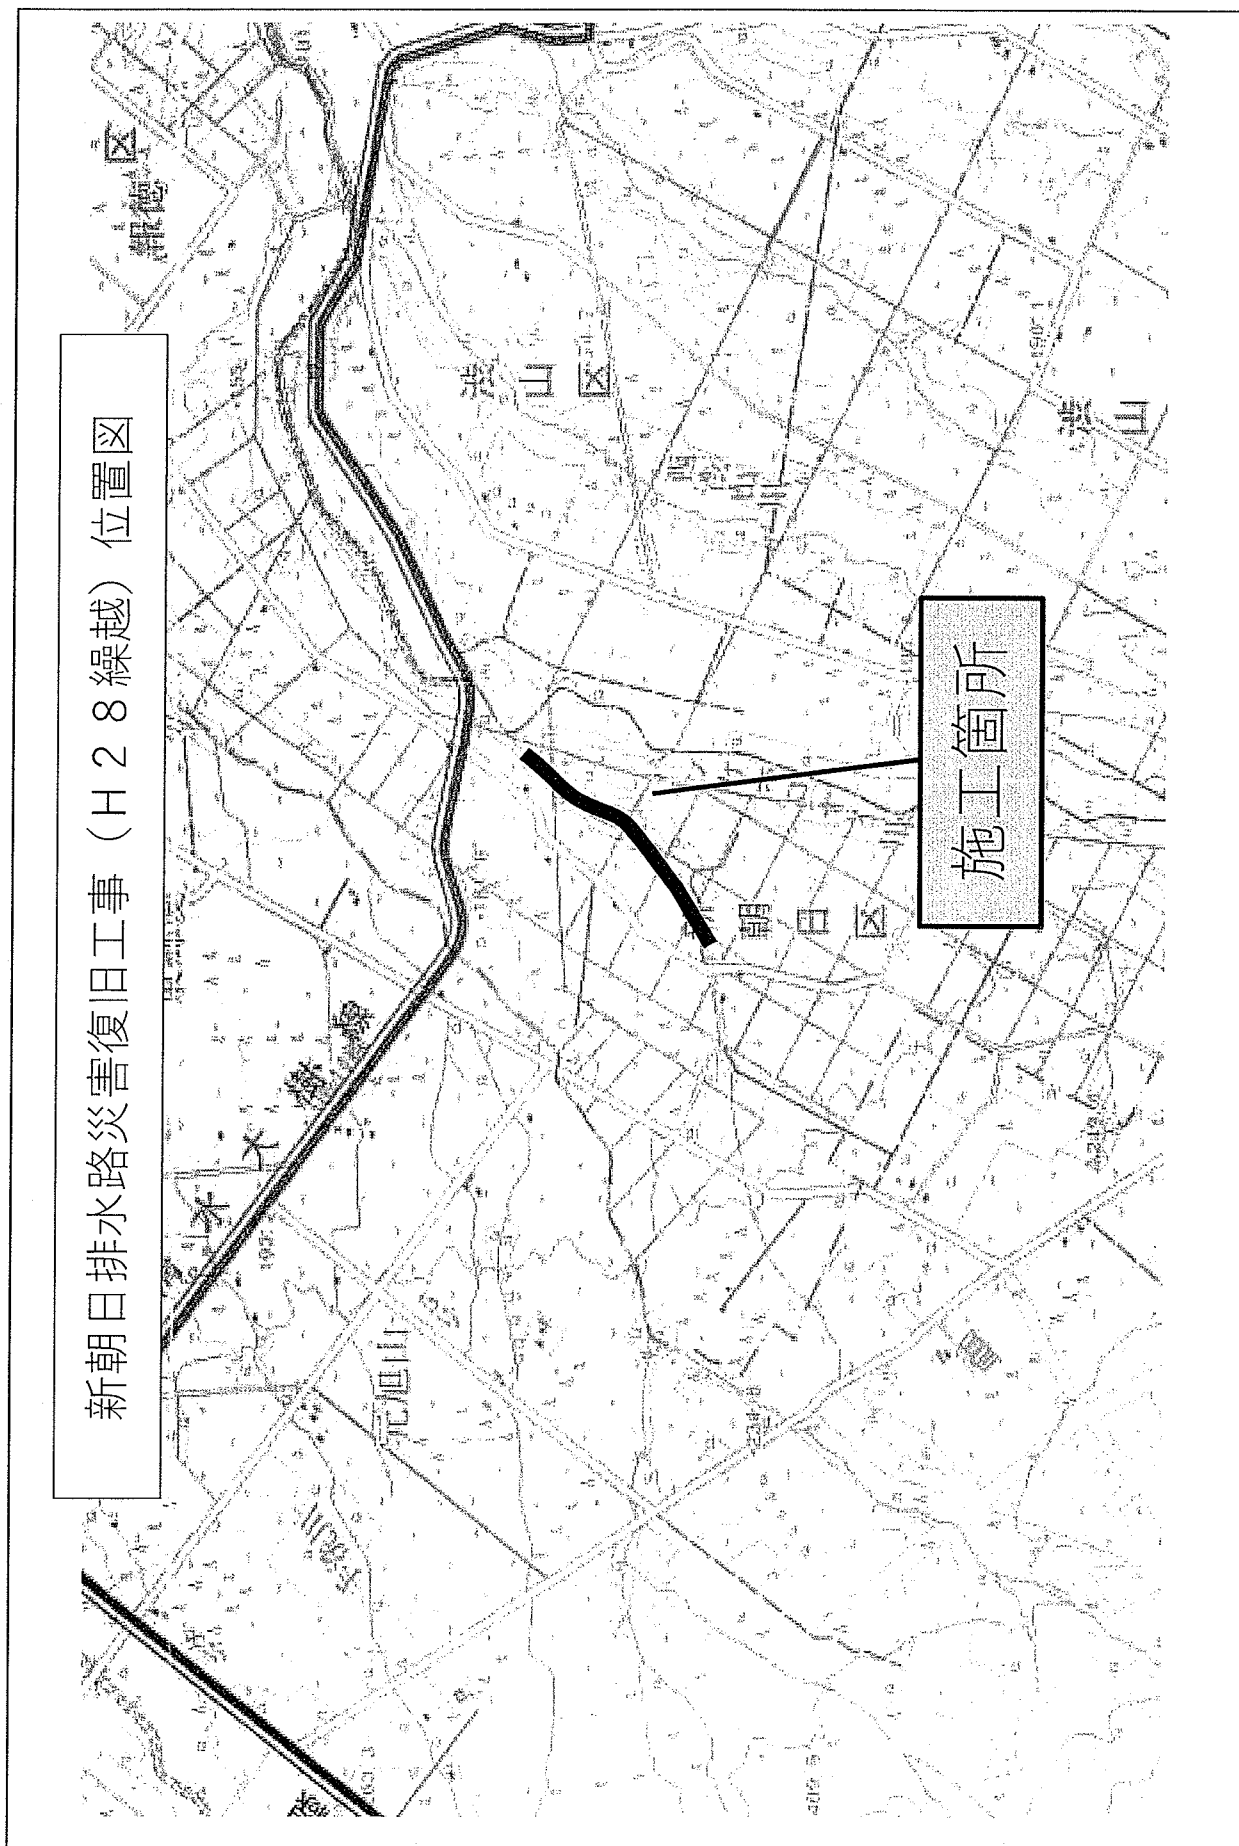

新朝日排水路災害復旧工事（H28緑越）位置図

設計変更理由書(新朝日排水路)

1. 変更理由

現地精査による数量変更が生じたことにより、設計金額及び工期を変更する。

2. 1の理由に伴い下記のとおり変更が生じた

・新朝日5地区

【現地精査による数量変更】

- (1) 土工－購入盛土材、運搬の増: 462m³→1,360m³
- (2) 法面工－法面整形増に伴う張芝の増: 113m²→491m²
- (3) 護岸工－連節ブロック布設替、新設の増: 1,108m²→1,289m²、896m²→1,018m²
- (4) 落口工－鉄筋コンクリート管撤去・新設の増: 6m→11m
- (5) 仮設工－工事用水中ポンプ運転の増: 60日→99日
- (6) 除雪工－冬季施工のため: 工事用道路0km→1.4km

当初契約額	42,984,000円
変更後契約額	56,894,400円
差 額	(増額) 13,910,400円
